

# ALLEGATO "A"

**Comune di Pont Canavese**

Provincia di TO

## DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2006, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** MESSA IN SICUREZZA LAVORI DI MIGLIORAMENTO DI INNESTO DI VIABILITA' COMUNALE AL KM 38+800 DELLA SP 460 DEL GRAN PARADISO ACCESSO SCUOLA ELEMENTARE E STRADE DIVERSE

**COMMITTENTE:** Comune di Pont Canavese.

**CANTIERE:** SP 460 Km 38+800, Pont Canavese (TO)

Pont Canavese, 04/05/2017



**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

**(Arch. Roberto ZANIN)**

Per presa visione

**IL RUP**

.....  
**(Geom. Anna AIROLDI)**

**Arch. ZANIN Roberto**

Frazione Preparato 35/1

10081 CASTELLAMONTE (TO)

Te.: 333.4134264 Fax: 0124.510462

E-Mail: roberto\_zenin@alice.it

CarTas by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

MESSA IN SICUREZZA LAVORI DI MIGLIORAMENTO DI INNESTO DI VIABILITA'  
COMUNALE AL KM 38+800 DELLA SP 460 DEL GRAN PARADISO ACCESSO  
SCUOLA ELEMENTARE E STRADE DIVERSE

· Pag. 1

# TABELLA ANALITICA GANTT

**Tabella Analitica Gantt**

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>Allestimento area di cantiere</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	3	3	04/09/2017	06/09/2017
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	3	04/09/2017	06/09/2017
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	3	3	04/09/2017	06/09/2017
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	3	3	04/09/2017	06/09/2017
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	3	3	04/09/2017	06/09/2017
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	3	3	04/09/2017	06/09/2017
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	3	3	04/09/2017	06/09/2017
<b>Realizzazione nuovo svincolo</b>						
Scavo di sbancamento	1	E	5	7	05/09/2017	11/09/2017
Scavo a sezione ristretta	1	E	3	5	08/09/2017	12/09/2017
Rimozione di segnaletica orizzontale	1	E	3	3	05/09/2017	07/09/2017
Rimozione di segnaletica verticale	1	E	3	3	05/09/2017	07/09/2017
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	3	3	12/09/2017	14/09/2017
Realizzazione di scogliera (mezzi terrestri)	1	E	10	14	14/09/2017	27/09/2017
Rimozione di guard-rails	1	E	3	3	05/09/2017	07/09/2017
Formazione di rilevato stradale	1	E	6	8	02/10/2017	09/10/2017
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione	1	E	4	4	09/10/2017	12/10/2017
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione	1	E	4	6	11/10/2017	16/10/2017
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione	1	E	4	4	16/10/2017	19/10/2017
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	5	7	19/10/2017	25/10/2017
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	4	4	23/10/2017	26/10/2017
Formazione di fondazione stradale	1	E	5	8	26/10/2017	02/11/2017
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	3	5	02/11/2017	06/11/2017
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	E	5	5	20/11/2017	24/11/2017
Montaggio di apparecchi illuminanti	1	E	2	2	23/11/2017	24/11/2017
Montaggio di guard-rails	1	E	5	5	06/11/2017	10/11/2017
Posa di segnaletica verticale	1	E	5	7	08/11/2017	14/11/2017
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	3	3	13/11/2017	15/11/2017
Pulizia di sede stradale	1	E	3	3	15/11/2017	17/11/2017
<b>Ripristino piazzale scuola elementare</b>						
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	4	7	27/10/2017	02/11/2017
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	5	7	02/11/2017	08/11/2017
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	6	8	08/11/2017	15/11/2017
Pulizia di sede stradale	1	E	3	3	13/11/2017	15/11/2017
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	4	6	15/11/2017	20/11/2017
<b>Ripristini strade varie</b>						
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	6	9	31/10/2017	08/11/2017

**Tabella Analitica Gantt**

Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	9	11	07/11/2017	17/11/2017
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	6	8	17/11/2017	24/11/2017
Pulizia di sede stradale	1	E	6	8	20/11/2017	27/11/2017
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	5	7	24/11/2017	30/11/2017
Smobilizzo del cantiere	1	E	6	8	24/11/2017	01/12/2017

**LEGENDA:**

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA


Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E &lt;Nessuna impresa definita&gt;

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



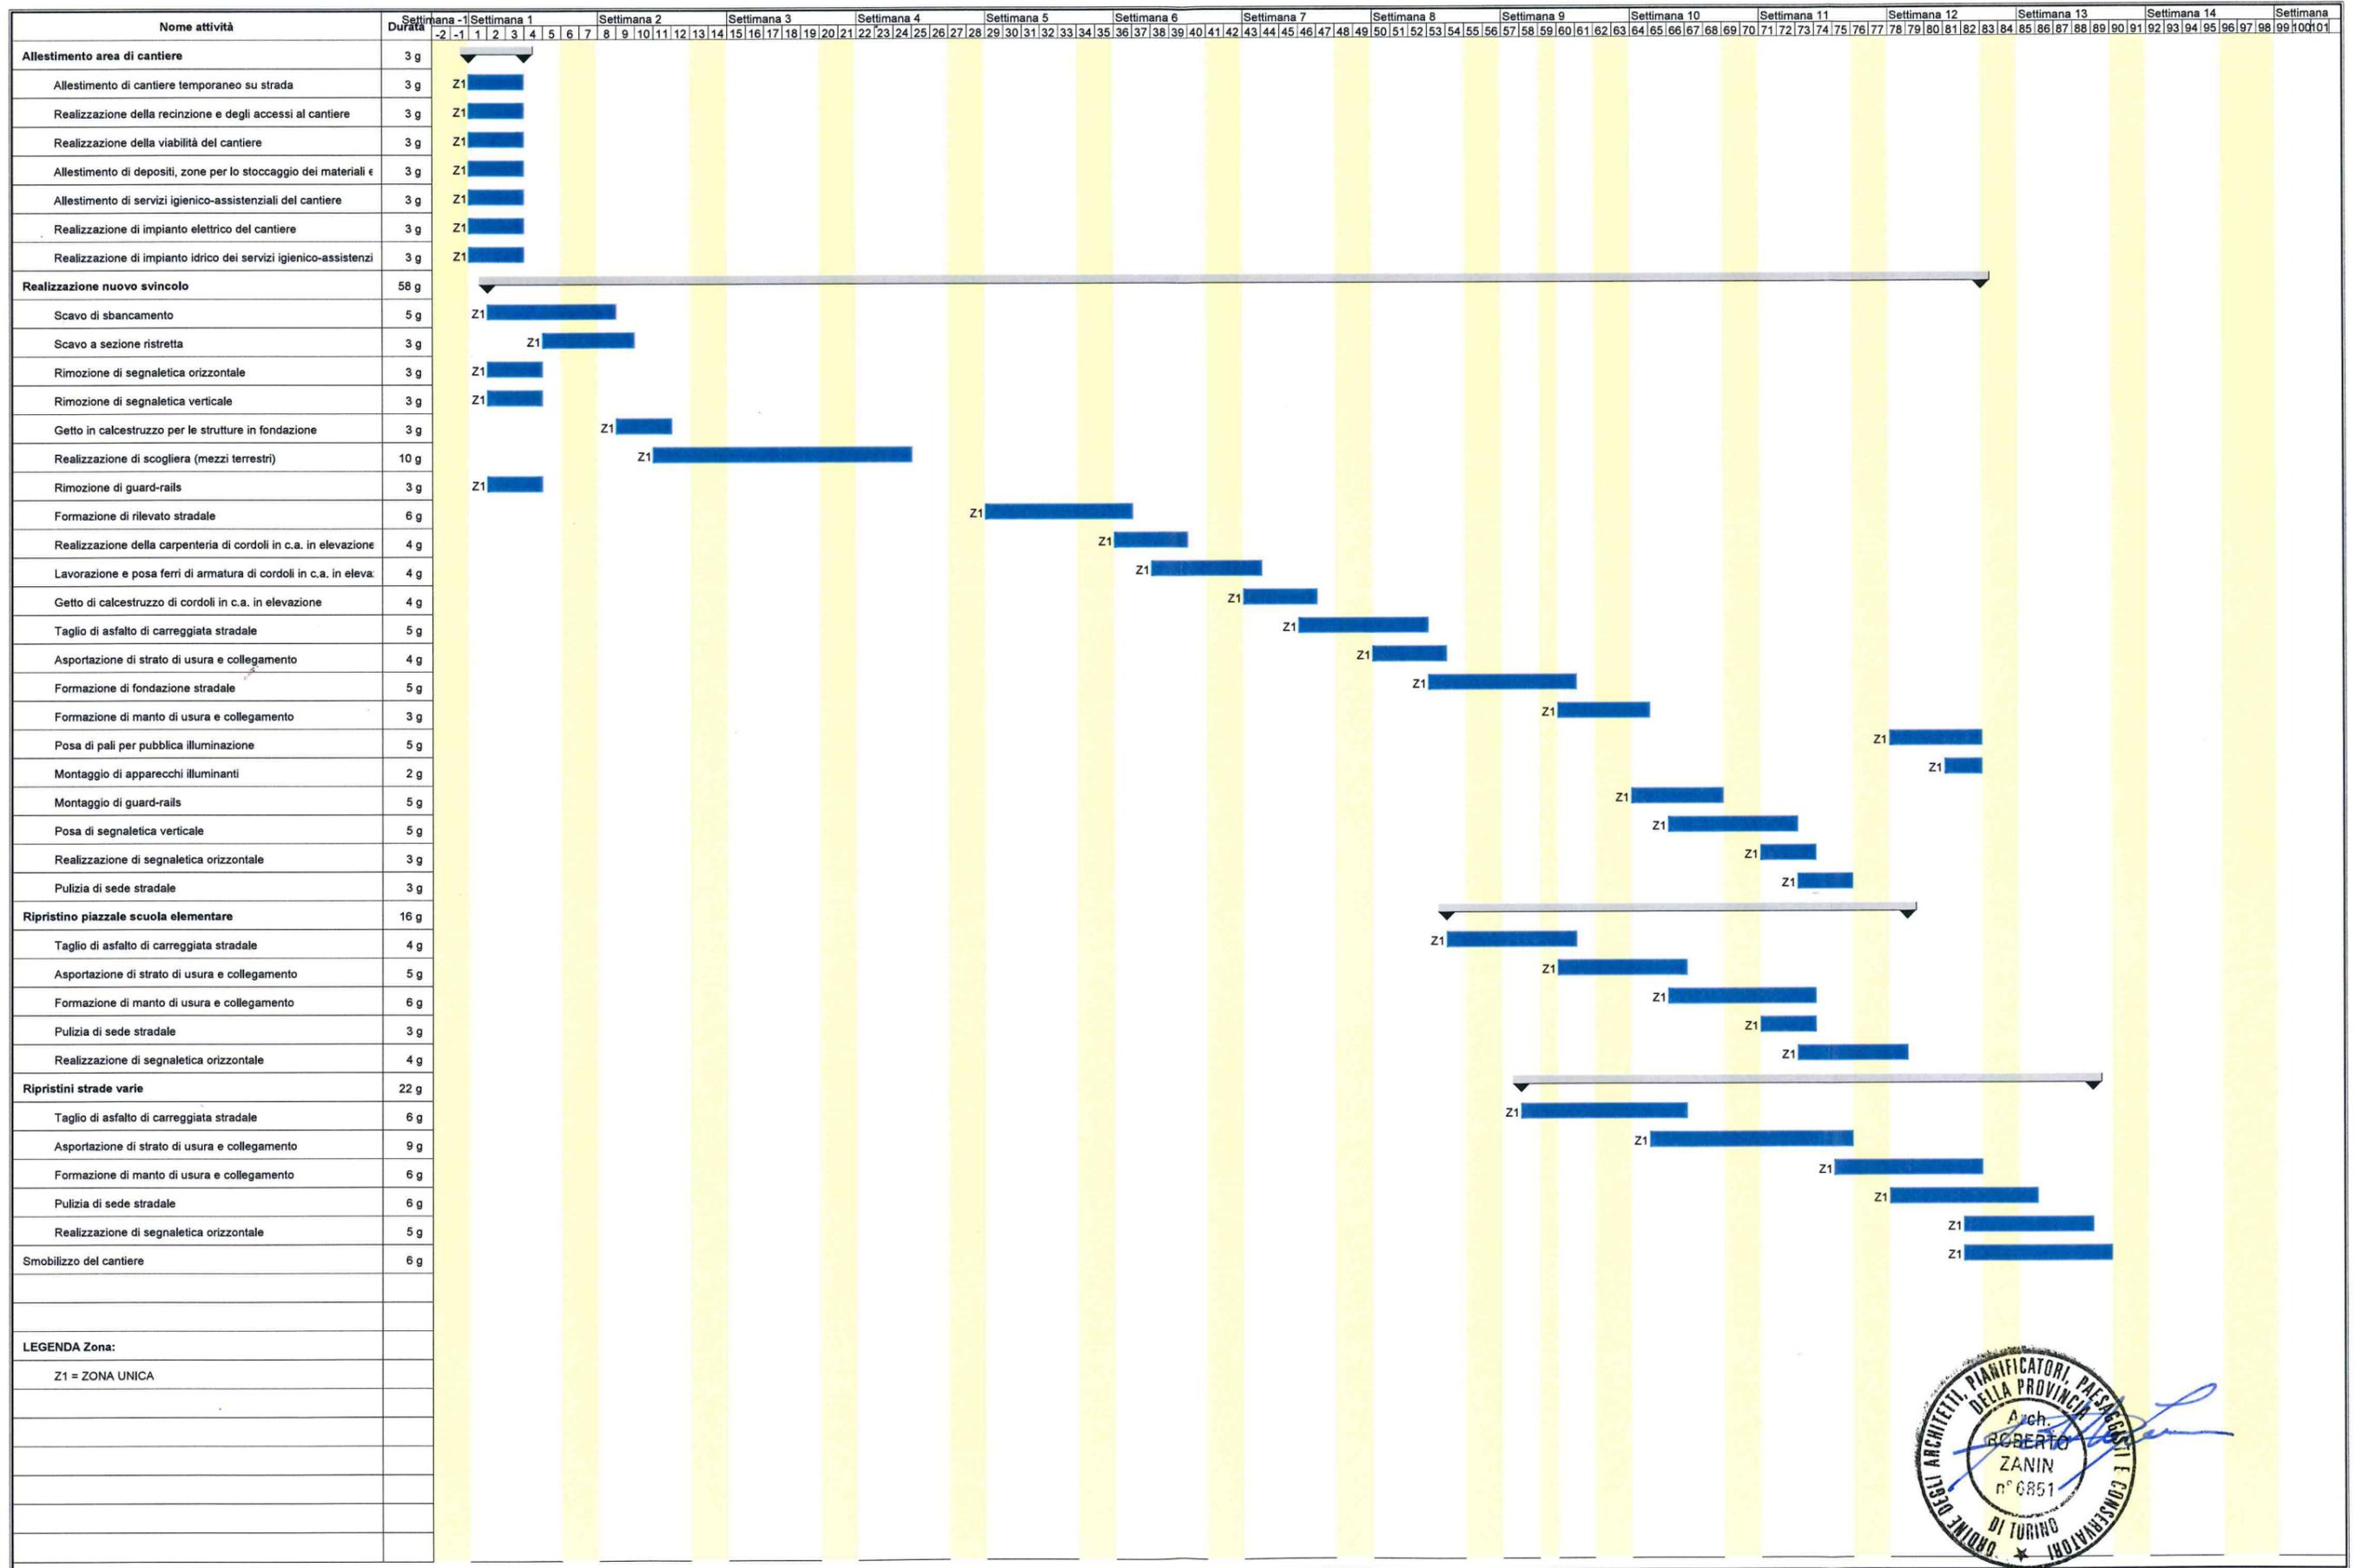

LEGENDA Zona:  
Z1 = ZONA UNICA

